

ENTREPRENEURS

DOCUMENT INTERNE

TEAM MEETING MENSUEL — JEUDI 8 OCTOBRE 2026 · 14H30-16H00

Cap sur le 31 décembre

Édition orientée vision et 90 jours : déroulé, objectifs de fin d'année, plan des 90 jours et briefs à envoyer en amont à chaque pôle.

Rédigé par Boris Arduy — COO

Diffusion Toutes les équipes

Sources Comptes rendus du team building (2-3 oct.), Atlas-Brain (Team Meeting de septembre, Core, CRO et Weekly de septembre, Cockpit)

Sommaire

01	Le meeting en une page	3
02	Déroulé minute par minute	4
03	Le cap : vision et objectifs de fin d'année	5
	Ce qu'Alec pose en 15 minutes	5
	La chaîne opérationnelle : du premier contact au client qui réussit	6
04	Le plan des 90 jours	7
	Calendrier commun	7
05	Ce que chaque pôle prépare	8
	Les consignes communes	8
	Pôle Sales et SDR — Sabrina, Alexandre · maillon 2, Convertir	8
	Pôle Marketing, Evergreen et Contenu — Cédric, Raphaël, Océane · maillon 1, Attirer	8
	Pôle Delivery et Coaching — Claire, Christelle · maillon 3, Délivrer	9
	Pôle Produit et Plateforme — Anisse, Quentin, Léonard · maillon 4, Fidéliser	9
	Pôle Revenus et Partenariats — Fabrice · maillons 1 et 4	10
	Pôle Finance — Jordan, Angèle · socle	10
06	Les nouvelles règles du jeu	11
07	Avant, pendant et après le meeting	12
	Préparation	12

Le meeting en une page

Le Team Meeting mensuel garde son format et son créneau habituels ; seul l'angle de cette édition change. Elle est orientée vision, planning et actions sur les 90 jours qui restent : chaque collaborateur repart en sachant où va l'entreprise d'ici le 31 décembre, ce que fait son pôle et ce qu'on attend de lui.

- **Vision** : traduire le cap 2030 et les décisions du team building en trois priorités de fin d'année.
- **Planning** : un calendrier commun des 12 semaines qui restent, avec trois points d'étape.
- **Actions** : chaque pôle s'engage sur 3 actions datées, avec un owner, et formule une demande aux autres pôles.

Ce qui change par rapport aux éditions précédentes	Pourquoi
Les pôles présentent sur un format commun de 3 slides, 5 min chacun	Comparer les pôles et sortir 18 actions datées
Une chaîne en 4 maillons avec des jalons datés, revus à chaque Team Meeting jusqu'en décembre	Suivre des avancées concrètes plutôt que des chiffres éparés
Les chiffres sont validés en amont, jamais discutés en séance	Même règle qu'en CRO
Le plan d'action est diffusé dans Works sous 48 h	Éviter que les annonces restent orales

Date : jeudi 8 octobre 2026, 14h30–16h00. Animation : Alec (vision, clôture) et Boris (plan, règles, timing).

Déroulé minute par minute

Heure	Séquence	Qui	Contenu	Livrable
14h30–14h35	Ouverture	Alec	L'angle de cette édition : vision et 90 jours	—
14h35–14h50	Le cap	Alec	Ce qu'on retient du team building, vision 2030 en une slide, 3 priorités de fin d'année	3 priorités T4
14h50–15h00	La chaîne en 4 maillons	Boris	Attirer, convertir, délivrer, fidéliser : où ça casse, ce qu'on répare d'ici le 31/12	Jalons T4
15h00–15h10	Le plan des 90 jours	Boris	Calendrier oct.–déc., points d'étape, qui porte quoi	Planning commun
15h10–15h42	Les pôles prennent la parole	6 pôles × 5 min	3 slides : où on en est, 3 actions des 90 jours, une demande aux autres pôles	18 actions datées
15h42–15h50	Les nouvelles règles du jeu	Boris, Jordan	Standards de management, Works, consultation de la finance, adoption de la plateforme	Règles écrites
15h50–15h58	Engagements et reconnaissance	Tous	Chacun écrit son engagement n°1 dans le chat ; 3 remerciements nominatifs	Engagements individuels
15h58–16h00	Clôture	Alec	Prochaines dates, rendez-vous au point d'étape du 15 novembre	—

Le délai de préparation est court (3 jours) : les briefs partent aujourd'hui. Les 32 minutes des pôles sont la séquence la plus à risque pour le timing. Boris coupe à 5 min ; ce qui n'a pas été dit passe dans le support écrit.


Le cap : vision et objectifs de fin d'année

■ Ce qu'Alec pose en 15 minutes

1. **Ce qu'on retient du team building**, en cinq messages :
 1. des process solides, partagés par tous ;
 2. on informe autant qu'on décide ;
 3. la data fait foi ;
 4. chacun dit ses limites ;
 5. chaque responsable décide pour son équipe.
2. **Vision 2030 en une slide** : accompagner, connecter, rassembler ; 25 000 entrepreneurs aidés fin 2030 ; Scale des 10 ans en avril 2030.
3. **Trois priorités de fin d'année**, reprises des priorités déjà annoncées en septembre :
 - **Performer en Sales** : mieux préparer chaque rendez-vous, réduire les no-shows, lancer les nouvelles offres.
 - **Fiabiliser l'exécution** : data propre, HubSpot refondu, Works comme source unique, adoption de la plateforme.
 - **Préparer 2027** : réussite client mesurée, nouvelles lignes de revenus, budget 2027, démarrage fort le 1er janvier.

■ La chaîne opérationnelle : du premier contact au client qui réussit

Plutôt qu'une liste d'indicateurs, Boris présente l'entreprise comme une seule chaîne en 4 maillons, portée par un socle commun. Chaque pôle sait sur quel maillon il agit, où ça casse aujourd'hui et ce qui doit être réparé d'ici le 31 décembre. On suit des jalons concrets (fait ou pas fait), pas des chiffres isolés.

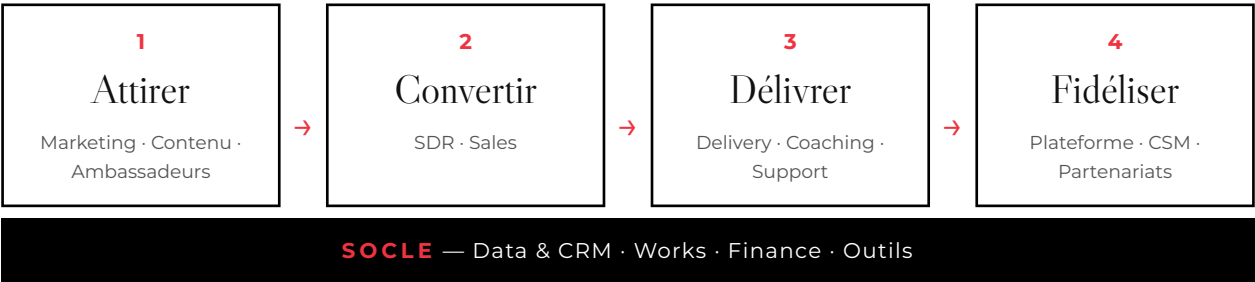

Maillon	La question	Signal de santé suivi chaque mois	Ce qui doit être vrai au 31/12
1. Attirer	Fait-on venir les bons prospects, de façon régulière ?	RDV réservés par semaine	Calendrier des lancements de nov.–déc. publié (15/10) · ambassadeurs réactivés et mises en relation suivies (fin oct.) · attribution des contenus (Déclic, Secrets d'Entreprise) en place (nov.)
2. Convertir	Chaque rendez-vous est-il préparé, tenu et suivi ?	Taux de show-up	Confirmation systématique des RDV (fin oct.) · « sell the call » dans le parcours SDR (oct.) · motifs de perte et relances dans HubSpot (mi-nov.) · nouvelles offres lancées (nov.)
3. Délivrer	Chaque client reçoit-il ce qu'il a acheté, au bon niveau ?	Taux de sessions délivrées	Support formalisé (15/10) · accès ouverts dès le paiement validé · Success Score en production · outils coachs présentés à tous les coachs (nov.)
4. Fidéliser	Le client utilise-t-il l'écosystème et reste-t-il ?	Clients actifs sur la plateforme	Multi-licences et formation plateforme (fin oct.) · CSM en place · annuaire partenaires sur la plateforme · premier groupe Résidence (déc.)
Socle	Les équipes ont-elles les bons outils et la bonne info ?	Projets Works à jour (owner, date, prochaine action)	HubSpot restructuré · dashboards utilisés par chaque pôle · nouveautés plateforme annoncées et documentées · budget 2027 par pôle

Les signaux de santé servent à voir la tendance d'un mois sur l'autre ; ils ne sont pas présentés avec des cibles en plénière. Chaque jalon a un owner dans Works et passe au vert ou au rouge à chaque Team Meeting jusqu'en décembre.

Le plan des 90 jours

■ Calendrier commun

Période	Jalon	Owner
Semaine du 5 oct.	Démarrage du lancement d'octobre ; inscriptions clients au plus tard le 10/10	Marketing, Produit
6 oct.	Plan d'action Sales revu	Boris, Sabrina
8 oct., 14h30-16h	Team Meeting d'octobre	Alec, Boris
15 oct.	Nouvelles offres finalisées ; support client formalisé	Pôle Sales, Fabrice, Pôle Delivery
18 oct.	Épisode 2 de Secrets d'Entreprise	Océane
Fin oct.	Multi-licences et formation plateforme ; cartographie des partenaires (marketplace)	Boris, Fabrice
Toutes les 2 semaines	Task force no-show	Boris
Novembre	Lancements de novembre (dont l'intégration de LegalPlace)	Marketing, Fabrice
15 nov.	Point d'étape 1 : revue des jalons de la chaîne	Alec, Boris
Nov.-déc.	Premier groupe du programme Résidence	Fabrice
Fin nov.	Point d'étape 2 et Team Meeting de novembre	Alec, Boris
~15 déc.	Point d'étape 3 : dernières actions de l'année, préparation de janvier	Alec, core team
Décembre	Budget 2027 construit avec chaque pôle	Jordan
31 déc.	Chiffre de référence des entrepreneurs accompagnés figé	Direction
Janvier 2027	Démarrage fort, sur l'élan des 2 derniers mois	Tous
Mars 2027	Prochain grand team building	Alec

Ce que chaque pôle prépare

Cette partie est à transmettre telle quelle aux responsables de pôle aujourd'hui, lundi 5 octobre, au plus tard en fin de journée.

■ Les consignes communes

1. **Trois slides maximum**, à déposer dans le dossier partagé du meeting le mardi 6 octobre à 18h.
2. **Slide 1 — Notre maillon** : sur quel maillon de la chaîne vous agissez, son signal de santé (tendance sur 3 mois) et le principal point de rupture que vous observez. Les données sont validées avec Boris le mercredi 7 octobre avant 12h ; aucune donnée ne se discute en séance.
3. **Slide 2 — Nos 3 actions des 90 jours** : une ligne par action avec owner, date et résultat attendu. Chaque action existe déjà dans Works.
4. **Slide 3 — Notre demande aux autres pôles** : une seule demande, adressée à un pôle nommé, avec la date à laquelle vous en avez besoin.
5. **Cinq minutes de parole**, coupées au timer. Ce qui n'est pas dit passe dans le support écrit.

■ Pôle Sales et SDR — Sabrina, Alexandre • maillon 2, Convertir

Éléments pour la slide 1

- Taux de show-up, de no-show et d'annulation (avant R1, entre R1 et R2).
- Taux de closing global.
- Encaissé à la première mensualité.
- CA signé et encaissé du mois.

Points concrets à préparer

- Où en est la confirmation des RDV à J-1 et quelques heures avant (SDR Hub, WhatsApp) ?
- Les grandes lignes des nouvelles offres (actées le 15 octobre, donc après le meeting) et le plan de formation des sales pour les vendre.
- Le protocole de follow-up : qui relance, à quel rythme, avec quel motif de perte catégorisé dans HubSpot ?
- Où en sont les recrutements SDR ?

Demande possible : au Marketing, un « sell the call » intégré au funnel avant le RDV.

■ Pôle Marketing, Evergreen et Contenu — Cédric, Raphaël, Océane • maillon 1, Attirer

Éléments pour la slide 1

- Résultats du lancement d'octobre : inscrits, RDV, CA.
- Coût par RDV réservé et panier moyen des funnels Evergreen.
- Inscrits et membres actifs de la communauté gratuite depuis le 28 septembre.

Points concrets à préparer

- Le calendrier des lancements de novembre et de décembre.
- Comment la plateforme entre dans les pitches et les webinaires (démonstration en direct, captures avant / après).
- Le tracking du passage d'un épisode Déclat à un client.
- Les dates de Secrets d'Entreprise et la mise en ligne du nouveau site.

Demande possible : aux Sales, un retour régulier sur la qualité des leads par funnel.

■ Pôle Delivery et Coaching — Claire, Christelle • maillon 3, Délivrer**Éléments pour la slide 1**

- Délivrabilité des sessions.
- Note coaching et NPS, segmentés par produit.
- Nombre de clients actifs et de coaches actifs.
- Présence au Live Onboarding.

Points concrets à préparer

- La date de mise en production du Success Score et la formation des coaches.
- Les retours des coaches sur leurs outils (Super Bob, Ariane, assistant de coaching) : ce qui les aide, ce qui manque.
- La conciergerie : nombre de signaux faibles traités et clients rappelés.
- Le support : volume de tickets, délai de réponse, part automatisée.
- L'arrivée de la CSM et son périmètre.

Demande possible : au Produit, une date de livraison pour l'espace client refondu.

■ Pôle Produit et Plateforme — Anisse, Quentin, Léonard • maillon 4, Fidéliser**Éléments pour la slide 1**

- Utilisateurs actifs de la plateforme (clients et coaches).
- Usage par module.
- Nombre de fonctionnalités livrées depuis septembre.

Points concrets à préparer

- La feuille de route jusqu'au 31/12, avec des dates : multi-licences, Live AI Coaching, espace client refondu, MCP.
- Les 3 fonctionnalités que chaque pôle doit connaître, et la vidéo associée.
- Comment les équipes remontent un besoin ou un bug.

Demande possible : à la Delivery et aux Sales, 30 minutes de retours structurés par mois.

■ Pôle Revenus et Partenariats — Fabrice • maillons 1 et 4

Éléments pour la slide 1

- Ambassadeurs actifs et mises en relation réalisées.
- Partenaires d'affiliation signés.
- Inscrits pressentis au programme Résidence.
- Épisodes sponsorisés signés.

Points concrets à préparer

- Le calendrier du programme Résidence (date du premier groupe).
- La cartographie des partenaires (marketplace) : verticaux couverts, verticaux manquants, fin octobre.
- Les deals d'affiliation (DIM, LegalPlace, etc.) et leur place dans les webinaires de novembre.
- Le media kit et les créneaux d'épisodes sponsorisés.
- Le processus de suivi après une mise en relation par un ambassadeur.

Demande possible : aux coachs, d'orienter vers l'annuaire partenaires (fiche d'une page).

■ Pôle Finance — Jordan, Angèle • socle

Éléments pour la slide 1

- Nombre de demandes traitées et délai moyen de réponse.
- Factures fournisseurs réglées dans les délais.

Points concrets à préparer

- Le calendrier du budget 2027 : quand chaque pôle est appelé, ce qu'il doit apporter.
- La règle de consultation de la finance en 5 questions, et le circuit des demandes via Angèle.

Demande possible : à tous les pôles, leur prévision de dépenses de novembre et de décembre avant le 15 novembre.

Les nouvelles règles du jeu

Huit minutes pour annoncer, à toute l'entreprise, les règles issues du team building. Elles sont publiées dans le wiki de Works le jour même.

Règle	Concrètement	Porté par
1:1 hebdomadaire	20 min par semaine avec chaque report direct	Tous les managers
Réunions	30 min par défaut, objectif dans l'invitation, compte rendu le jour même	Tous
Déléguer	Importance, temps, date proposée, checklist, pré-mortem, impact	Tous les managers
Works	Ce qui n'est pas dans Works n'existe pas : owner, date et prochaine action pour chaque projet	Anisse, Boris
Consulter la finance	Prix, marge, contrat, budget, commission ou outil connecté à HubSpot : la finance avant la décision ; demandes via Angèle	Jordan
Adoption plateforme	Chaque fonctionnalité annoncée, vidéo publiée, usage mesuré	Boris
Data	Une donnée se valide en amont, jamais en séance	Boris
Limites	Quand on atteint sa limite, on le dit à son manager	Tous

Avant, pendant et après le meeting

■ Préparation

Quand	Action	Qui
Lun. 5 oct., matin	Valider avec Alec le déroulé, les 3 priorités et les jalons de la chaîne (15 min)	Boris
Lun. 5 oct., soir	Envoyer les briefs aux 6 responsables de pôle, avec le modèle de 3 slides	Boris
Lun. 5 oct., soir	Partager l'ordre du jour de cette édition sur le canal habituel	Boris
Mar. 6 oct., 18h	Slides des pôles déposées dans le dossier partagé	Responsables de pôle
Mer. 7 oct., 12h	Chiffres de chaque pôle validés	Boris + responsables
Mer. 7 oct., soir	Support unique assemblé ; slide de la chaîne à jour	Boris
Jeu. 8 oct., 13h30	Répétition du timing avec Alec (15 min) ; scribe et timer confirmés	Boris, Alec
Jeu. 8 oct., 14h30	Animation, timer, scribe	Alec, Boris, scribe
Sam. 10 oct.	Plan d'action diffusé ; les 18 actions des pôles créées ou vérifiées dans Works	Boris, scribe
15 nov.	Point d'étape 1 sur les jalons de la chaîne	Alec, Boris
